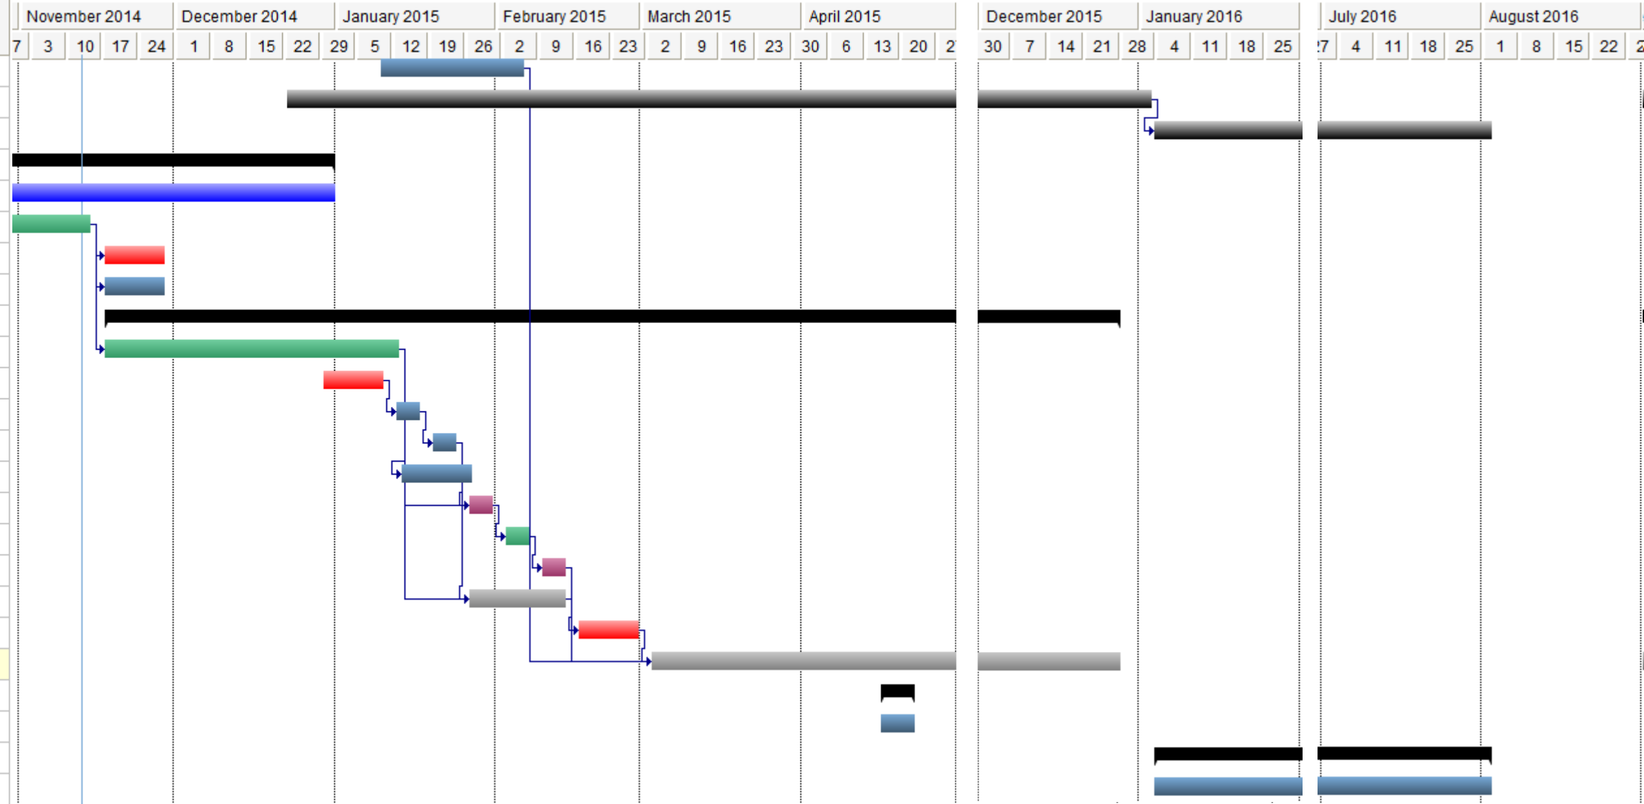	Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1	ABATEMENT	20d	01/09/2015	02/05/2015	
2	CLASSROOM LEVEL SHUTDOWN (Seismic Retrofit)	269d?	12/22/2014	12/31/2015	
3	CLASSROOM LEVEL SHUTDOWN (Classroom Remodel)	151d?	01/01/2016	07/29/2016	2
4	**ALL PHASES - DD**	**66d?**	**10/01/2014**	**12/31/2014**	
5	GC CONSTRUCTABILITY CONSULTING	66d?	10/01/2014	12/31/2014	
6	DESIGN DEVELOPMENT (DD)	33d?	10/01/2014	11/14/2014	
7	UofU REVIEW & COMMENT (DD)	10d?	11/17/2014	11/28/2014	6
8	CONTRACTOR SOQ	10d	11/17/2014	11/28/2014	6
9	**PHASE B&C - CD, BID & CONSTRUCTION**	**290d?**	**11/17/2014**	**12/25/2015**	
10	CONSTRUCTION DOCUMENTS (CD)	41d	11/17/2014	01/12/2015	6
11	FACILITIES REVIEW & COMMENT #1	10d	12/29/2014	01/09/2015	
12	DESIGN TEAM RESPONSE #1	5d	01/12/2015	01/16/2015	11
13	FACILITIES REVIEW & COMMENT #2	5d	01/19/2015	01/23/2015	12
14	STRUCTURAL PEER REVIEW	10d	01/13/2015	01/26/2015	10
15	CODE REVIEW & COMMENT #1	5d	01/26/2015	01/30/2015	10,13
16	CODE, DESIGN TEAM RESPONSE #1	5d	02/02/2015	02/06/2015	15
17	CODE REVIEW & COMMENT #2	5d?	02/09/2015	02/13/2015	16
18	BID & ADDENDUMS	15d	01/26/2015	02/13/2015	10,13
19	SELECT GC & AWARD	10d	02/16/2015	02/27/2015	18
20	CONSTRUCTION	215d	03/02/2015	12/25/2015	1,17,19
21	**FUNDING**	**5d**	**04/15/2015**	**04/21/2015**	
22	PHASE C FUNDING	5d	04/15/2015	04/21/2015	
23	**SPACE PLANNING**	**151d?**	**01/01/2016**	**07/29/2016**	
24	LEVEL 2 - CLASSROOM REMODEL	151d?	01/01/2016	07/29/2016
